

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ NIIE

MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM AGILE

BÁO CÁO AGILE / SCRUM

Product Backlog 40 User Stories và kế hoạch 2 Sprint đã gộp

Thông tin	Nội dung
Giảng viên hướng dẫn	ThS. Trần Thanh Nhã
Đề tài	Nền tảng quản lý công việc và nhân sự doanh nghiệp TaskSyncEnterprise
Nhóm thực hiện	Scrum Team TaskSyncEnterprise - 5 thành viên
Phiên bản tài liệu	1.0 - Chuẩn hóa 2 Sprint

TP. Hồ Chí Minh, tháng 7 năm 2026

Tóm tắt

Báo cáo trình bày cách nhóm áp dụng Scrum cho TaskSyncEnterprise, chuẩn hóa Product Backlog 40 User Stories thuộc 12 Epics và gộp bốn Sprint ban đầu thành hai Sprint theo yêu cầu giảng viên.

Quy tắc bắt buộc: Sprint cũ 1 + 2 được gộp thành Sprint 1 mới; Sprint cũ 3 + 4 được gộp thành Sprint 2 mới. Mọi bảng, Daily Scrum và Release Plan trong bộ hồ sơ sử dụng quy ước này.

1. Project Charter

Thuộc tính	Nội dung
Tên dự án	TaskSyncEnterprise
Mục tiêu	Quản lý công việc, dự án, tổ chức, nhân sự, nghỉ phép và thông báo realtime.
Khung làm việc	Scrum với Product Backlog, Sprint Backlog, Daily Scrum, Review và Retrospective.
Quy mô	5 thành viên; 40 User Stories; 12 Epics; 242 Story Points theo tổng từng dòng backlog.
Công nghệ	FastAPI, React/Vite, SQL Server, Redis, WebSocket và Docker Compose.

2. Scrum Team và trách nhiệm

Mã	Thành viên	Vai trò	Trách nhiệm chính
A	Huỳnh Lê Thành Nhân	Product Owner / Full Stack Lead	Tầm nhìn sản phẩm, kiến trúc, ưu tiên backlog, code review.
B	Nguyễn Đức Mạnh	Scrum Master / Backend Developer	Facilitate Scrum, Backend API, database và workflow nghiệp vụ.
C	Nguyễn Lê Huy Hoàng	Frontend Developer	React UI, Kanban, form và trải nghiệm người dùng.
D	Phạm Anh Tuấn	QA / Test Engineer	Test plan, API/E2E, regression và quality gate.
E	Nguyễn Anh Tuấn	Research & Documentation	Nghiên cứu, biên bản Scrum, báo cáo và chuẩn hóa tài liệu.

Điểm cần xác nhận: Một số tài liệu nguồn ghi khác nhau về họ tên người phụ trách tài liệu và họ của Product Owner. Bộ hồ sơ này dùng danh sách trong workbook/báo cáo tổng hợp mới nhất; nhóm cần


đối chiếu MSSV trước khi nộp.

3. Cơ sở Scrum áp dụng

- Ba trụ cột: Minh bạch, Kiểm tra và Thích ứng.
- Năm giá trị: Cam kết, Tập trung, Cởi mở, Tôn trọng và Dũng cảm.
- Artifacts: Product Backlog, Sprint Backlog và Increment.
- Events: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review và Sprint Retrospective.

Scrum Workflow

Luồng kế hoạch - thực thi - kiểm tra - thích ứng

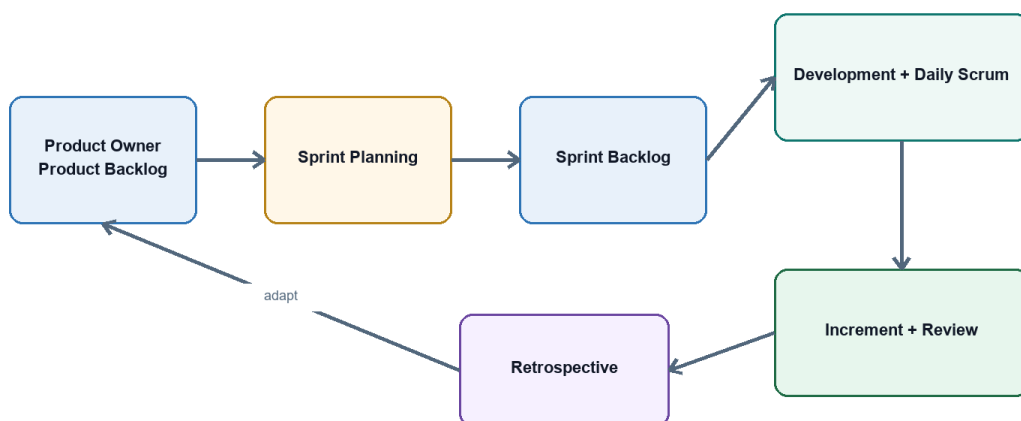


Hình 1. Scrum Workflow áp dụng cho TaskSyncEnterprise

4. Cấu trúc Product Backlog

Product Backlog được nhóm theo 12 Epics: Access & Security, Employee, Department, Project, Task/Kanban, Collaboration, File, Vacation, Overtime, Notification, Analytics và Audit. Mỗi item có User Story, Priority, Story Point, Business Value, Assignee, Target Sprint và Acceptance Criteria.

Sơ đồ phân rã chức năng

Phân nhóm phạm vi sản phẩm phục vụ Product Backlog

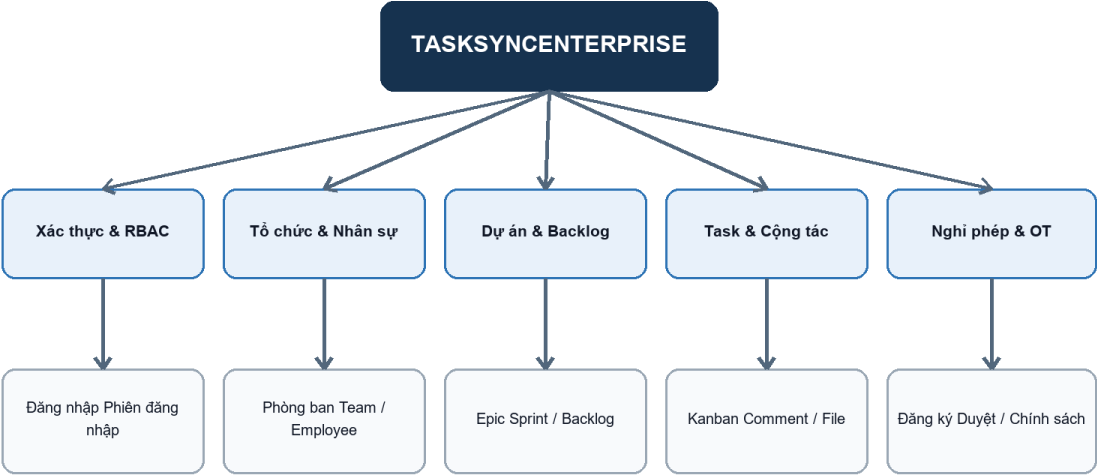

Hình 2. Phân rã chức năng làm cơ sở tổ chức backlog

Nhóm chức năng	User Stories tiêu biểu	Giá trị
Xác thực & RBAC	US01-US04	Truy cập an toàn và phân quyền đúng.
Project / Task	US05-US07, US15-US20, US30	Lập kế hoạch và thực thi công việc.
Tổ chức / Nhân sự	US09-US14	Chuẩn hóa cơ cấu và hồ sơ nhân viên.
File / Notification	US08, US21, US29, US31-US34	Cộng tác và cập nhật kịp thời.
Vacation / Overtime	US22-US28	Số hóa quy trình hành chính.
Analytics / Audit	US35-US40	Đo lường và truy vết hoạt động.

5. Chuẩn hóa Sprint theo yêu cầu giảng viên

Sprint cũ	Thời gian cũ	Sprint mới	Phạm vi	Story Points
Sprint 1	02/07-16/07	Sprint 1	US01-US08	39
Sprint 2	16/07-30/07	Sprint 1	US09-US18	68
Sprint 3	30/07-13/08	Sprint 2	US19-US29	64

Sprint cũ	Thời gian cũ	Sprint mới	Phạm vi	Story Points
Sprint 4	13/08-27/08	Sprint 2	US30-US40	71

Baseline sau khi gộp: Sprint 1: 02/07-30/07/2026, 18 User Stories, 107 SP. Sprint 2: 30/07-27/08/2026, 22 User Stories, 135 SP. Tổng: 40 User Stories, 242 SP. Trang Summary của file nguồn ghi 228 SP nhưng không khớp phép cộng từng dòng; bộ hồ sơ dùng tổng dòng để có thể kiểm tra.

6. Kế hoạch Sprint 1

Thuộc tính	Nội dung
Sprint Goal	Thiết lập nền tảng an toàn, cơ cấu tổ chức, hồ sơ nhân sự và năng lực Project/Task cơ bản.
Phạm vi	US01-US18; Auth/RBAC, Project Wizard, Kanban, Employee, Department, Backlog và Collaboration.
Capacity	107 Story Points sau khi gộp Sprint cũ 1 và 2.
Definition of Done	Code review; test đạt; không lỗi nghiêm trọng; tài liệu/API cập nhật; demo được.
Các vấn đề ghi nhận	Dead-code frontend, loading giả, HTTP 409 thiếu thông điệp và import Excel.

6.1. Retrospective Sprint 1

Nhóm	Nội dung
Went well	Kiến trúc, Auth/RBAC, schema tổ chức và Kanban được thống nhất.
Needs improvement	Dọn code cũ chậm; validation và thông điệp lỗi chưa đồng đều.
Action	Static scan trước release; kiểm tra state machine ở Backend; validate batch import trước commit.

7. Kế hoạch Sprint 2

Thuộc tính	Nội dung
Sprint Goal	Hoàn thiện Task, Vacation/OT, Notification realtime, Analytics và Audit.
Phạm vi	US19-US40; Task editor, mention, cleanup, leave/OT, WebSocket, báo cáo và audit.
Capacity	135 Story Points sau khi gộp Sprint cũ 3 và 4.
Rủi ro	CI timeout, Redis availability, orphaned files, transaction quỹ phép và dependency advisory.
Kết quả kỳ vọng	Increment demo được; test regression đạt; tài liệu kiến trúc và Agile đồng bộ.


Mốc tương lai: Theo ngày lập hồ sơ 29/07/2026, các mốc từ 30/07 đến 27/08 là kế hoạch/baseline. Nhóm cần cập nhật trạng thái thực tế và bằng chứng hợp trước khi dùng làm biên bản đã hoàn thành.

8. Các Scrum Events

Sự kiện	Timebox	Đầu vào	Đầu ra
Sprint Planning	Tối đa 4 giờ/Sprint	Product Backlog, capacity	Sprint Goal và Sprint Backlog
Daily Scrum	15 phút/ngày	Tiến độ 24 giờ, blocker	Kế hoạch ngày và action xử lý
Sprint Review	Tối đa 2 giờ	Increment và Acceptance Criteria	Feedback và backlog cập nhật
Retrospective	Tối đa 1.5 giờ	Dữ liệu Sprint	1-3 hành động cải tiến

Activity Diagram - Chu trình Sprint

Các sự kiện Scrum và vòng phản hồi sang Product Backlog

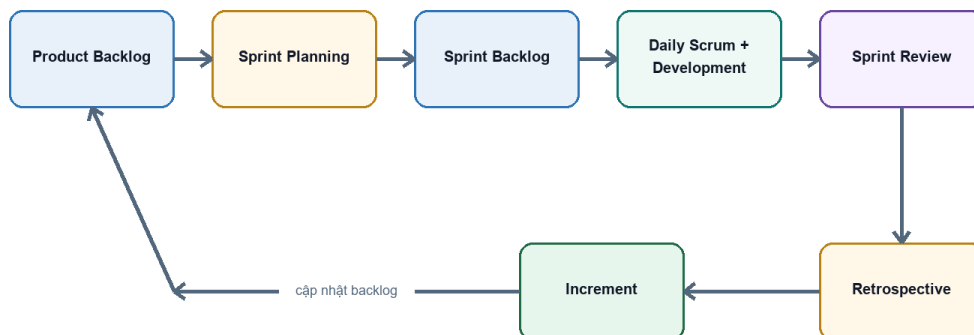

Hình 3. Activity Diagram chu trình Sprint

9. Definition of Ready và Definition of Done

Definition of Ready	Definition of Done
User Story đúng mẫu As a / I want / So that.	Acceptance Criteria được kiểm tra và Product Owner chấp nhận.
Priority, Business Value và Story Point đã thống nhất.	Code review đạt; test liên quan chạy xanh.
Phụ thuộc, dữ liệu và thiết kế đủ rõ.	Không có lỗi Blocker/Critical còn mở.
Assignee và Sprint được xác định.	Tài liệu, migration và cấu hình được cập nhật.

10. Quản trị chất lượng và đo lường

- Velocity = tổng Story Point hoàn thành trong Sprint.
- Completion Rate = số User Stories Done / tổng User Stories cam kết.
- Defect trend theo Sprint và severity; mọi bug có Root Cause, Fix và Lesson Learned.
- Không kết luận production-ready chỉ dựa vào số test; phải kiểm tra dependency, infrastructure, backup/restore và health.

Workbook Product_Backlog_TaskSyncEnterprise.xlsx đi kèm là nguồn dữ liệu cập nhật cho 40 User Stories, hai Sprint Backlog, Dashboard và Release Plan. Nhật ký Daily Scrum nằm trong file Daily_Scrum_2_Sprint_TaskSyncEnterprise.docx.

11. Kết luận

Việc gộp Sprint giúp báo cáo phù hợp yêu cầu học phần mà không làm mất truy vết: mỗi User Story vẫn giữ Feature, Epic, Assignee và Story Point. Nhóm cần duy trì tính minh bạch bằng cách tách rõ dữ liệu đã xác nhận với kế hoạch tương lai, cập nhật Daily Scrum và trạng thái backlog từ bằng chứng thực tế.

Tài liệu nguồn và đối chiếu

- Report/Tham khảo/Co_su_Ly_Thuyet.docx
- Report/Tham khảo/LTHN_Agile_Final.pdf (chỉ tham khảo bố cục, không dùng nghiệp vụ Hilo Cinema)
- Report/Tham khảo/Agile_Project_Management.xlsx
- Report/Tham khảo/Agile_Tracking.xlsx
- Report/Tham khảo/bao-cao-thong-ke-bug-timeline (1).xlsx
- Daily Sprint 1: https://docs.google.com/document/d/1fa-B87BGnb2J-axm0YS6oYN5BeOzqFjK_acfUXfYw_E/edit
